



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЗОЛОЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»
ЗОЛОЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

80700, Львівська обл., м. Золочів, вул. Коновальця Є., 48, тел./факс (0265) 4-21-36, e-mail: zolcrl@i.ua
КОД ЄДРПОУ 01996272

07.12.23 № 1379/18

Директору
Західної державної інспекції
З ядерної та радіаційної безпеки
Державної інспекції
ядерного регулювання України
Оксані ДЖУРАНІЮК

Заступнику директора
З ядерної та радіаційної безпеки
В'ячеславу БОЙЧУКУ

Доповнення до листа №1139/18 від 19.10.2023 року

Адміністрація КНП «Золочівська ЦРЛ» скерує уточнюючі документи, а саме:

- Акт на закриття прихованих робіт №11;
- Акт на закриття прихованих робіт №12;
- Схему розміщення центру КТ на замурування віконних проємів (фактично);
- Детальний обмірний план приміщень лікувально-приймального відділення КНП «Золочівська ЦРЛ» під кабінет комп'ютерної томографії;
- Перший поверх: кабінет №9 – кабінет психолога.

- Другий поверх: приміщення №108 – роздаткова неврологічного відділення;
приміщення №108 – маніпуляційна.

Директор

КНП «Золочівська ЦРЛ»



Тарас ЯЦУНСЬКИЙ

АКТ НА ЗАКРИТТЯ ПРИХОВАНИХ РОБІТ № 11

Виконаних в: Капітальний ремонт приміщень 1-го поверху кабінету комп'ютерної томографії у складі лікувально-приймального відділення КНП "Золочівська центральна районна лікарня" по вул. Павлова академіка, 48 в м. Золочеві Золочівського району Львівської області"
(найменування і місце розташування об'єкта)

"__" _____ 2023р.

Комісія у складі:

Представник будівельної організації

Генеральний директор ТзОВ "Золочівагробуд"
Барабаш Йосип Петрович
(Посада, ПІП)

Представник технічного нагляду замовника

Венгер Тарас Владиславович
Кваліфікаційні сертифікати:
АТ № 003052, АР № 009941
(Посада, ПІП, номер та серія сертифіката)

Представник авторського нагляду

ГАП ТзОВ "ФОКСІ АРТ"
Бекеша Тарас Андрійович
Кваліфікаційний сертифікат АА № 004904
(Посада, ПІП, номер та серія сертифіката)

Провели огляд робіт, виконаних:

ТзОВ "Золочівагробуд"
(найменування будівельної організації)

і склали цей акт про наступне:

1. До закриття представлені такі роботи: Заповнення віконного прорізу
готовим блоком оглядового вікна кімнати керування
(найменування прихованих робіт)

2. Роботи виконані за проектною документацією: Проектні рішення "Розрахунок
радіаційного (біологічного) захисту", рисунок № 3
(найменування проектно-організації, № креслень і дата їх складання)

3. При виконанні робіт застосовані: Дюбелі-шурупи 100x10 мм, герметик
сіліконовий, піна монтажна, вікно оглядове кімнати керування розміром 1200x800x8 мм,
із свинцевим еквівалентом 2,0 мм свинцю
(найменування матеріалів, конструкцій із посиланням на сертифікати або інші документи)

4. При виконанні робіт відсутні (або допущені) відхилення від проектно-організації:
відсутні.
(за наявності відхилень або порушень, вказується ким і коли погоджені, № креслень і дата погодження)

5. Дата: початок виконання робіт _____ .2023р.
закінчення виконання робіт _____ .2023р.

Рішення:

Роботи виконані відповідно до проектно-організації, стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов і відповідають вимогам їх прийняття.

На основі викладеного дозволяється виконання наступних робіт

Заповнення віконних прорізів процедурної кімнати КТ

(найменування робіт і конструкцій)

Представники:

Будівельної організації

Технічного нагляду замовника

Проектної організації

Примітка. Керівник Генпідприємної організації заздалегідь інформувати членів комісії про дату і місце її роботи



АКТ НА ЗАКРИТТЯ ПРИХОВАНИХ РОБІТ № 12

Виконаних в: Капітальний ремонт приміщень 1-го поверху кабінету комп'ютерної томографії у складі лікувально-приймального відділення КНП "Золочівська центральна районна лікарня" по вул. Павлова академіка, 48 в м. Золочеві Золочівського району Львівської області"
(найменування і місце розташування об'єкта)

"__" ____ 2023р.

Комісія у складі:

Представник будівельної організації

Генеральний директор ТзОВ "Золочівагробуд"
Барабаш Йосип Петрович
(Посада, ПІП)

Представник технічного нагляду замовника

Венгер Тарас Владиславович
Кваліфікаційні сертифікати:
АТ № 003052, АР № 009941
(Посада, ПІП, номер та серія сертифіката)

Представник авторського нагляду

ГАП ТзОВ "ФОКСІ АРТ"
Бекеша Тарас Андрійович
Кваліфікаційний сертифікат АА № 004904
(Посада, ПІП, номер та серія сертифіката)

Провели огляд робіт, виконаних:

ТзОВ "Золочівагробуд"
(найменування будівельної організації)

і склали цей акт про наступне:

1. До закриття представлені такі роботи:

Заповнення (замурування) віконних прорізів процедурної кабінету КТ

(найменування прихованих робіт)

2. Роботи виконані за проектною документацією:

Проектні рішення "Розрахунок радіаційного (біологічного) захисту", рисунок № 3

(найменування проектної організації, № креслень і дата їх складання)

3. При виконанні робіт застосовані:

Повнотіла цегла будівельна рядова марки М-100, щільністю 1,6 г/см³, товщиною 510 мм на повну висоту вікна (Нв.=2125 мм) та оштукатурення товщиною 10 мм

(найменування матеріалів, конструкцій із посиланням на сертифікати або інші документи)

4. При виконанні робіт відсутні (або допущені) відхилення від проектної документації:

відсутні.

(за наявності відхилень або порушень, вказується ким і коли погоджені, № креслень і дата погодження)

5. Дата:

початок виконання робіт

____.____.2023р.

закінчення виконання робіт

____.____.2023р.

Рішення:

Роботи виконані відповідно до проектної документації, стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов і відповідають вимогам їх прийняття.

На основі викладеного дозволяється виконання наступних робіт

Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками

(найменування робіт і конструкцій)

Представники:

Будівельної організації


Технічного нагляду замовника

Проектної організації


Примітка. Керівник Генпідрядної організації заздалегідь інформує членів комісії про дату і місце її роботи




Схема розміщення центру гентрі КТ
та замурування віконних проємів
(фактично)

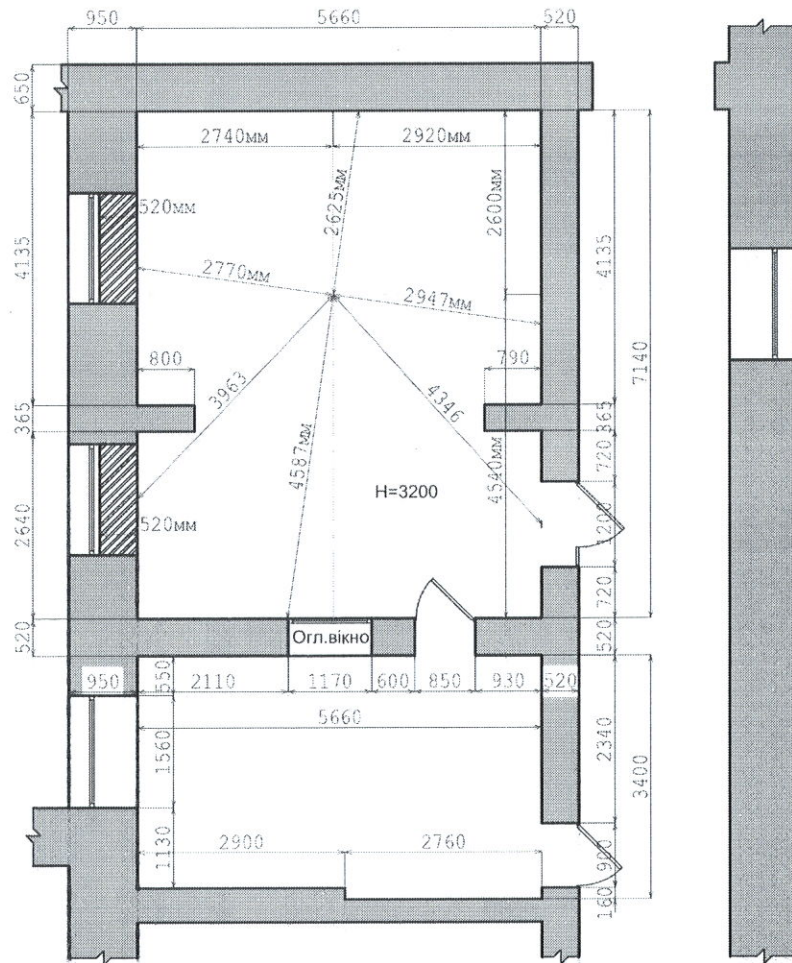

Оглядове вікно виконане із
свинцевим еквівалентом 2мм

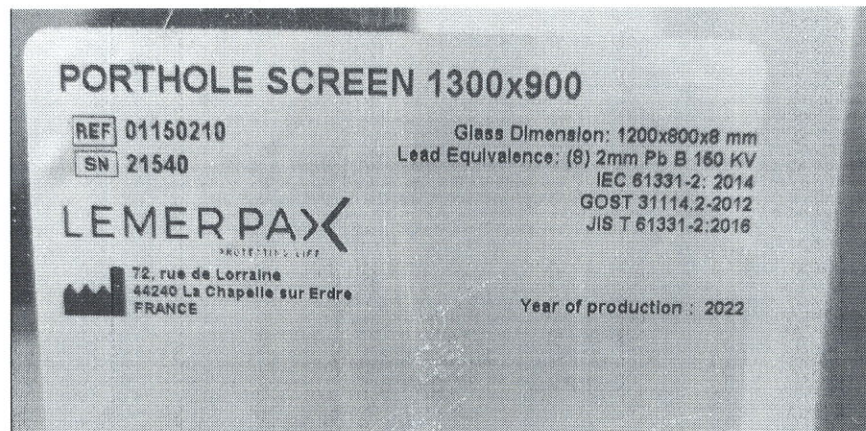

Детальний обмірний план
приміщень лікувально-приймального відділення
КНП "Золочівська ЦРЛ" по вул. Павлова академіка, 48
в м.Золочів Львівської області
під кабінет комп'ютерної томографії

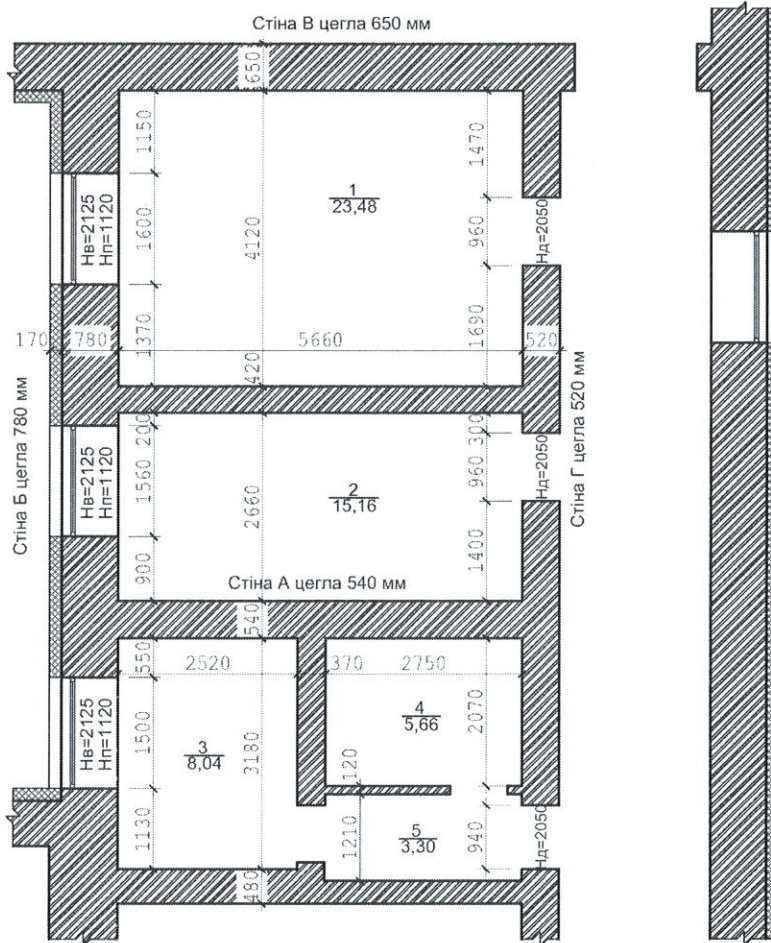

<u>Перекрыття:</u>	<u>Підлога:</u>
- гіпсокартон по каркасу - 7 см;	- плитка керамічна;
- цегляне склепіння - 14 см;	- стяжка - 1,5 см;
- засипка - 10 см;	- бетон не армований - 18 см;
- бетон - 10 см;	- засипка - 20 см;
- паркет.	- ґрунт ущільнений.
<u>Внутрішня стіна А приміщення:</u>	<u>Внутрішня стіна В коридор:</u>
- штукатурка - 1,5 см;	- штукатурка - 2 см;
- цегляна кладка - 51 см;	- цегляна кладка - 61 см;
- штукатурка - 1,5 см.	- штукатурка - 2 см.
<u>Зовнішня стіна Б на рівні 1-го поверху:</u>	<u>Внутрішня стіна Г коридор:</u>
- зовнішня штукатурка - 2 см;	- штукатурка - 1 см;
- утеплювач (мінеральна вата) - 15 см;	- цегляна кладка - 50 см;
- цегляна кладка - 76 см;	- штукатурка - 1 см.
- внутрішня штукатурка - 2 см.	

Інженер-проектувальник

Т.В. Торський

